Studio Sironi

N.	FASI DI LAVORO PER SETTIMANE	previsione uomini	previsione giorni
1	ALLESTIMENTO CANTIERE		
	pulizia area	3	5
	montaggio baracche	2	2
	allacciam.quadri elettrici	1	2
	allacciamenti idrici-sanitari	1	2
2	TAGLIO PIANTE E PULIZIA ARBUSTI	3	10
3	SBANCAMENTO E SCAVI	3	8
4	SAGOMTURA SCAVO E LIVELLAMENTO	3	2
5	IMPWRMEABILIZZAZIONE VASCA	3	2
6	CONDOTTO FOGNARI E ELETRICHE	3	5
7	SOTTOFONDI IN CLS	3	2
8	ESECUZIONE VANO TECNICO	3	14
9	POSA CONTENIMENTO PAVIMENTI	3	8
10	PAVIMENTI E FINITURE	3	6
11	POSA FILTRI E MACCHNARI	3	3
12	POSA IMPIANTI ELETTRICI E ILL.	3	5
13	OPERE PAVIMENTAZIONE PORFIDO	3	5
14	SISTEMAZIONE RECINZIONE ESIST.	2	7
15	SISTEMAZIONI FINALI E ALLACCIAMENTI	3	5
16	POSA PRATO E RECINZIONI	3	5
17	MONTAGGIO ARREDO URBANO	3	3
18	RECUPER FINITURE ARRETRATE	3	8
19	SMOBILIZZO CANTIERE, PULIZIE	2	8
20	RIEMPIMENTO LAGO	2	2
21	VERIFICHE E COLLAUDI	2	2
22	PERIODO FERIE E O FESTIVITA'		
		63	**121**
	TOTALE Uomini/giorno	U/g	**7623**

1 mese | 2 mese | 3 mese | 4 mese | 5 mese | 6 mese | 7 mese

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

MEDIA ADDETTI PER GIORNATA LAVOR ***2,63***

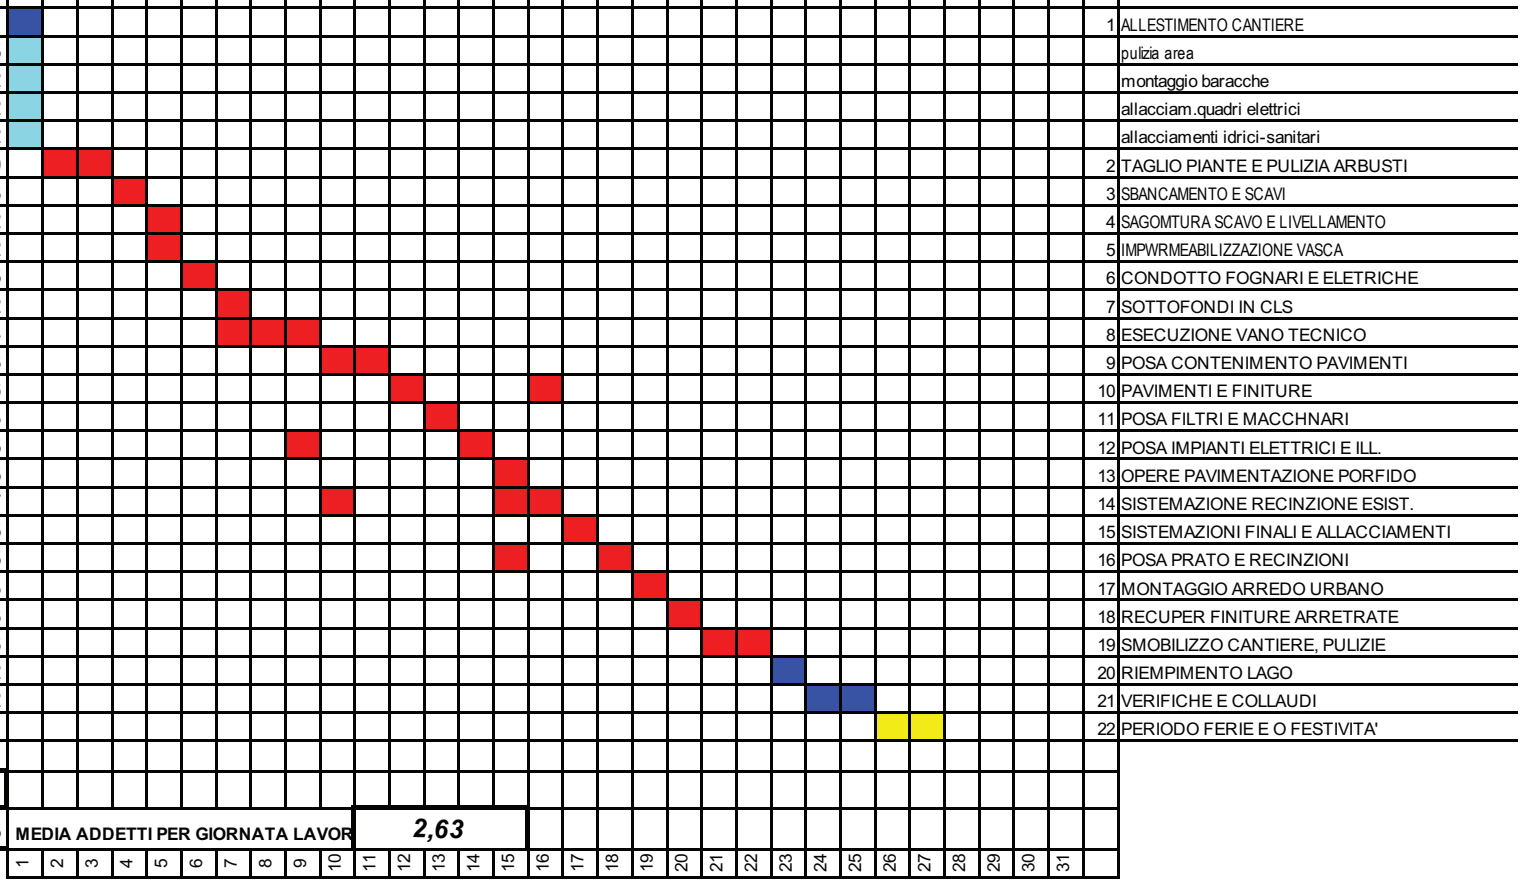

1 ALLESTIMENTO CANTIERE
pulizia area
montaggio baracche
allacciam.quadri elettrici
allacciamenti idrici-sanitari
2 TAGLIO PIANTE E PULIZIA ARBUSTI
3 SBANCAMENTO E SCAVI
4 SAGOMTURA SCAVO E LIVELLAMENTO
5 IMPWRMEABILIZZAZIONE VASCA
6 CONDOTTO FOGNARI E ELETRICHE
7 SOTTOFONDI IN CLS
8 ESECUZIONE VANO TECNICO
9 POSA CONTENIMENTO PAVIMENTI
10 PAVIMENTI E FINITURE
11 POSA FILTRI E MACCHNARI
12 POSA IMPIANTI ELETTRICI E ILL.
13 OPERE PAVIMENTAZIONE PORFIDO
14 SISTEMAZIONE RECINZIONE ESIST.
15 SISTEMAZIONI FINALI E ALLACCIAMENTI
16 POSA PRATO E RECINZIONI
17 MONTAGGIO ARREDO URBANO
18 RECUPER FINITURE ARRETRATE
19 SMOBILIZZO CANTIERE, PULIZIE
20 RIEMPIMENTO LAGO
21 VERIFICHE E COLLAUDI
22 PERIODO FERIE E O FESTIVITA'

Diagramma fasi lavorative Rigenerazione Urbana - Vedano al Lambro MB

Lug 2022
